

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



Voortgang stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 & voorbereiding nieuwe planperiode KRW

Bram Koning
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

1

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inhoud

1. Inleiding KRW & stroomgebiedbeheerplannen
2. KRW-impulsprogramma
3. Voortgang uitvoering stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
4. Tussenevaluatie KRW
5. Vooruitblik nieuwe planperiode 2028-2033

2

2


KRW: waarom?



- > Schoon, voldoende en gezond water is van levensbelang voor mens en natuur.
- > Europese Kaderrichtlijn Water (2000) – en verwante richtlijnen - vult dit in met een verbeterverplichting en een achteruitgangverbod.
- > Ziet op alle soorten water: zoet oppervlaktewater (beken, rivieren, meren), overgangswateren tussen zoet en zout, kustwateren en grondwater
- > 2027 belangrijke deadline

3

Doelen oppervlaktewater

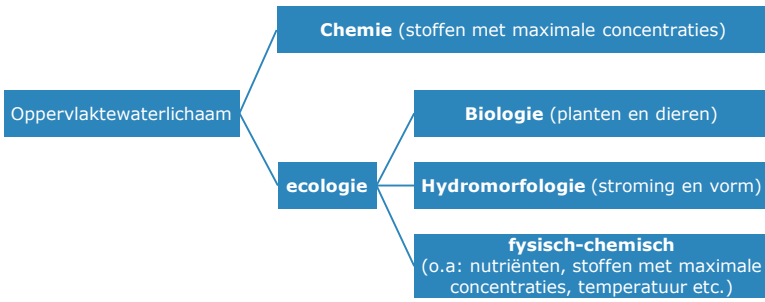


Oppervlaktewaterlichaam

- Chemie (stoffen met maximale concentraties)
- ecologie
 - Biologie (planten en dieren)
 - Hydromorfologie (stroming en vorm)
 - fysisch-chemisch (o.a.: nutriënten, stoffen met maximale concentraties, temperatuur etc.)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
24 januari 2024

4

4

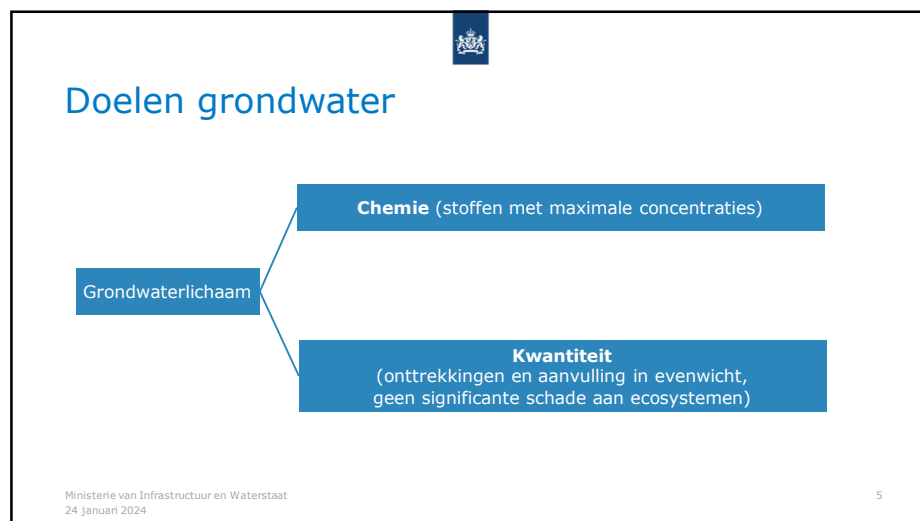

5

Opgaven

- › Belasting door chemische stoffen en nutriënten (o.a. landbouw, industrie, diffuse bronnen, buitenland)
- › Onnatuurlijke inrichting (harde scheiding zoet en zout water, onnodig gekanaliseerde beken, peilbeheer)
- › Exoten (uitheemse rivierkreeften)
- › Effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit

6

Hoe werken we aan deze opgaven

- › Opgaven liggen op terrein van veel verschillende overheden (Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten) en sectoren
- › Beleid en maatregelen opgenomen in gezamenlijke stroomgebiedbeheerplannen die iedere 6 jaar worden opgesteld
- › Inmiddels 3^e ronde in uitvoering 2022-2027 (dashboard verderop)
- › Veel bereikt maar ook nog stevige opgave naar 2027 (in uitvoering én benodigde extra stappen)
- › Daarom KRW-impulsprogramma gestart in 2023

7

7 actielijnen KRW-impulsprogramma

- › **1. Bewaken uitvoering afgesproken maatregelen**
- › **2. Verdere uitwerking van ruimtelijke maatregelen**
- › **3. Intensivering maatregelen voor stoffen**
- › **4. Verankering in regelgeving**
- › **5. Tussenevaluatie 2024**
- › **6. Goede motivering van uitzonderingen**
- › **7. Voorkomen van en voorbereiden op rechtszaken**


8



Dashboard voortgang maatregelen (1)

- > Jaarlijks aangeleverde voortgangsinformatie door waterschappen, provincies en Rijk
- > Daarbij risico-inventarisatie uitgevoerd op niet-tijdige uitvoering
- > Dashboard ook verzonden aan de Kamer: [Landelijk Dashboard KRW-maatregelen 2024 | Rapport | Rijksoverheid.nl](#)
- > Belangrijk: dashboard gaat over huidige planperiode (in voorgaande planperiodes al circa 3600 maatregelen uitgevoerd!)

9




Dashboard voortgang maatregelen (2)

- > **Generieke maatregelen (ca. 125):**
 - Mest: 7^e actieprogramma Nitraatrichtlijn & derogatiebeschikking (o.a. bufferstroken, vanggewassen, NV-gebieden), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
 - Gewasbeschermingsmiddelen: Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbeschermingsmiddelen
 - Medicijnresten: ketenaanpak medicijnresten
 - Instellen visserijvrije zones
 - Diverse Green Deals
- > **Gebiedsgerichte maatregelen (ca. 1600):**
 - Aanpassen wateronttrekking grond- en oppervlaktewater
 - Aanpak puntbronnen
 - Aanpak diffuse bronnen (emissies)
 - Regulering waterbeweging en hydromorfologie (inrichting)
 - Overige gebiedsgerichte maatregelen (o.a. maatregelen in de sfeer van ruimtelijke ordening)
- > Volgende slide dashboard uitvoering t/m 2023


10

9

10

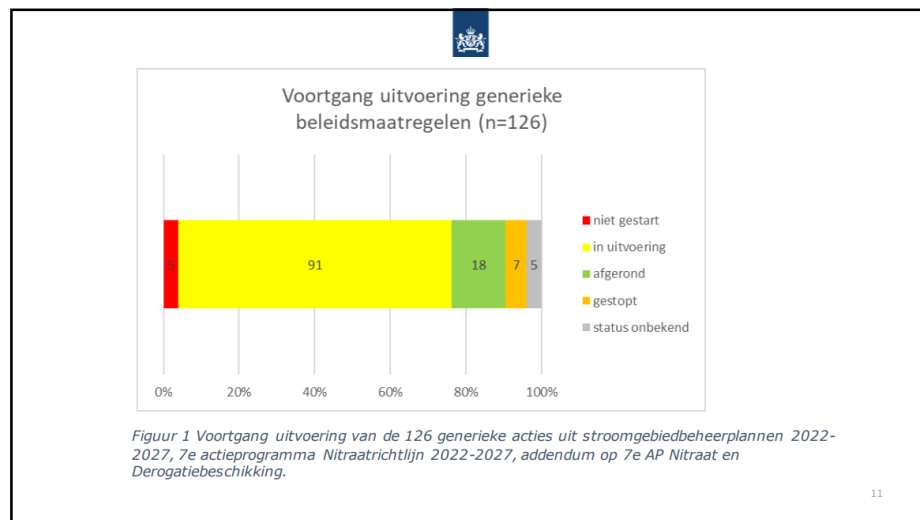

11

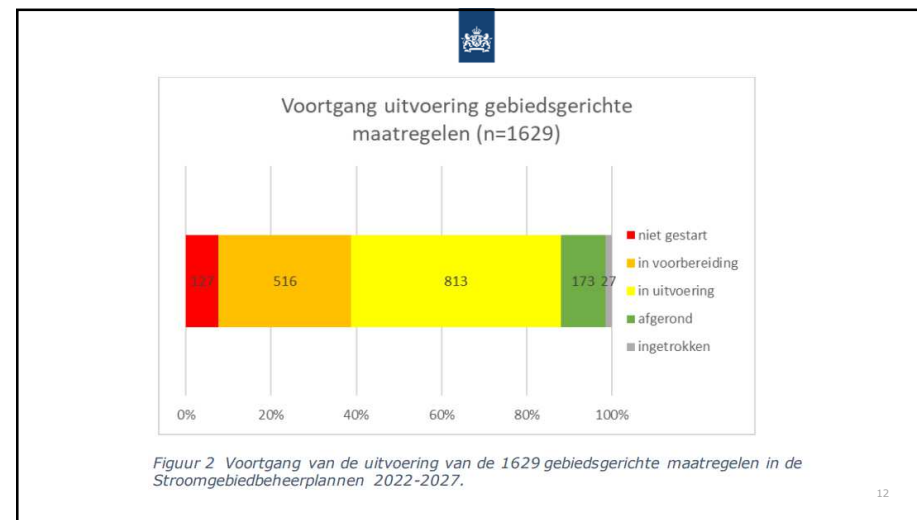

12




Dashboard voortgang maatregelen (3)

- › T/m 2023 is dus:
 - 14% vd 126 generieke beleidsmaatregelen uitgevoerd, 72% in uitvoering
 - 10,8% vd 1602 gebiedsgerichte maatregelen uitgevoerd, 50% in uitvoering
- › Reflectie: hockeystick-effect vs. grote opgave naar 2027
- › Ook risico's bij de uitvoering:
 - Generieke maatregelen: o.a. gebrek politiek draagvlak, personele capaciteit, deels vrijwillige karakter (in totaal circa 40% van resterende maatregelen)
 - Gebiedsgerichte maatregelen: o.a. grondbeschikbaarheid, draagvlak, capaciteit, financiering (in totaal circa 47% van resterende maatregelen)
- › Inzoomend op inrichtingsmaatregelen en hydromorfologie

13

13

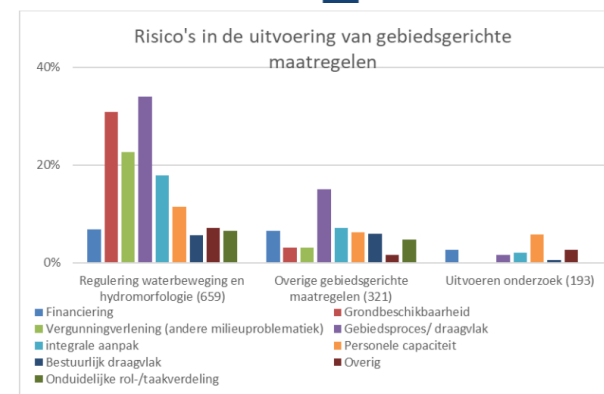

Figuur 15 Risico categorieën in de uitvoering van de gebiedsgerichte maatregelen (n=1433).

14

14



Mitigatie risico's

- › Vanuit impulsprogramma zetten waterbeheerders zich in om risico's zoveel mogelijk te mitigeren
- › Doel zoveel mogelijk nog uit te voeren vóór eind 2027
- › Op aantal zaken ook gezamenlijk inzet, bijvoorbeeld:
 - Succesfactoren voor kunnen beschikken over gronden
 - Analyse in hoeverre prioritering van KRW-maatregelen mogelijk is
 - Uitwisselen van ervaringen op gebied bezien en herzien vergunningen
- › Alles erop gericht om maatregelen zoveel mogelijk uitgevoerd te krijgen vóór eind 2027

15

15



Vooruitblik: KRW naar 2027 en verder

- › Nog stevige opgave naar 2027
- › Weten ook: KRW na 2027 niet klaar
- › Ook tussenevaluatie laat dit zien (o.a. uitdagingen op gebied van nieuwe stoffen, grondwater, exoten, klimaatverandering)
- › Weer nieuwe stroomgebiedbeheerplannen 2028-2028 waarin:
 - Verantwoording afleggen KRW-doelen 2027
 - Beleid & maatregelen planperiode 2028-2033
- › Dit jaar gestart met gezamenlijk werkprogramma

16

16



Eventuele vragen ter reflectie

- › *In hoeverre herkennen jullie de uitdagingen voor de uitvoering wat betreft de maatregelen voor rivieren en beken?*
- › *Wat willen jullie meegeven voor nieuwe plannen 2028-2033 voor wat betreft de plek van beken en rivieren hierin?*

17

17



18
